

 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO					
Nombre y cargo del Supervisor		FELIPE ESPINOSA CAMACHO			
Fecha del Informe		10/06/2019		Numero de informe	
Seguimiento con corte a		31	05		
DATOS GENERALES DEL CONVENIO					
No Contrato / Convenio		Acuerdo 361/2016		Fecha de Suscripción	02/12/2016
+++-++- ++++++ +++++-8+		AGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA- FAO-		Identificación	NIT 800091142-9
Objeto		Acuerdo UTF/COL/077/ cuyo objeto es la "Cooperación técnica para la implementación de la política de tierras", previo a las siguientes consideraciones".			
Alcance		Fortalecer las capacidades de la agencia nacional de tierras como de la institucionalidad colombiana a cargo de la nueva política de tierras. Este resultado se espera lograr a partir del desarrollo de los siguientes productos Producto 1: La agencia dispone de una metodología participativa, descentralizada y validada para el proceso de formalización de la propiedad a través del barrido predial, así como de un plan nacional de formalización. Producto 2: El Gobierno de Colombia dispone de una evaluación de resultados de las Zonas de reserva Campesina Constituidas, que permita realizar ajustes a la ley 160 de 1994 Producto 3: Sistema de Información de la gestión Jurídica de Tierras, de los procedimientos agrarios, diseñados en su estructura.			
Modalidad		CONVENIO DE COOPERACION		No y.Fecha de RP	01 de noviembre de 2016
Lugar de Ejecución		Bogota, Antioquia (4) Mojana (11), Ovejas, Sucre.		Duración inicial	13 meses
Valor inicial		Recursos ANT	Recursos Contraparte	Adiciones	Recursos ANT
		\$4.098.100.000	\$4.200.000.000		\$3.920.917.395
Prorrogas		Plazo inicial: 31 de diciembre de 2017		Fecha de Terminación Actual	30/09/2019

 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

	Enmienda 1: Prorrogar la duración hasta el 31 de julio de 2018. Enmienda 2: Prorrogar la duración hasta el 20 diciembre de 2018. Enmienda 3: Prorrogar la duración hasta el 31 de mayo de 2019. Enmienda 4: Prorrogar la duración hasta el 30 de septiembre de 2019.		
Póliza de garantías	N/A	Porcentaje de ejecución técnica a mayo 2019	98,3%
DETALLES DE EJECUCIÓN			
SEGUIMIENTO TÉCNICO ABRIL-MAYO 2019			
I. Plan operativo Durante el mes de abril se ajustó el plan operativo de acuerdo a las actividades a apoyar, especialmente en el marco del piloto de catastro multipropósito y ordenamiento social de la propiedad rural en Ovejas. El plan Operativo fue presentado ante comité coordinador y aprobado el 12 de abril. II. Análisis para adición y prórroga-Enmienda No. 4 Durante el mes de abril, FAO y ANT estudiaron la posibilidad de adelantar gestiones para adicionar y prorrogar el convenio para lo cual se estudió la ejecución de convenio, la cual se viene adelantando desde 2016, resultando en la culminación y entrega a satisfacción de los productos ii) y iii), a saber: - ii) El Gobierno de Colombia dispone de una evaluación de resultados de las Zonas de reserva Campesina Constituidas, que permita realizar ajustes a la ley 160 de 1994 - iii) Sistema de Información de la gestión Jurídica de Tierras, de los procedimientos agrarios, diseñados en su estructura. En cuanto al producto i) La agencia dispone de una metodología participativa, descentralizada y validada para el proceso de formalización de la propiedad a través del barrido predial, así como de un plan nacional de formalización, a partir del año 2017, FAO ha apoyado a la ANT en la realización del acompañamiento técnico al piloto de barrido predial masivo y procedimiento único, en el marco del piloto del catastro multipropósito y			



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

formalización, implementado por USAID en el municipio de Ovejas, Sucre. En este sentido ha brindado acompañamiento técnico a las siguientes actividades: a) labores de campo, atención a la comunidad y, seguimiento y articulación con socio USAID en el municipio del piloto; y b) A nivel nacional, validación y procesamiento de información catastral, técnica y jurídica, entregada por el socio USAID, y c) generación de lecciones aprendidas y recomendaciones a la implementación.

Gracias a la experticia que ha desarrollado FAO en el desarrollo mismo del acompañamiento, su apoyo ha sido indispensable para el avance en la implementación del piloto de barrido predial masivo, el cual no tiene precedentes en país, ni semejantes en la actualidad en Colombia.

El piloto se encuentra finalizando la fase de barrido predial masivo en lo concerniente al procesamiento y entrega de información a las entidades competentes, entre ellas, la ANT. En esta tarea, FAO brinda acompañamiento técnico a la gestión de validación de información entregada por parte del socio USAID; al proceso de análisis técnico jurídico necesario y previo a la apertura de actos administrativos de clarificación de derechos por parte de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas; y a la operación en campo en cuanto a la recepción de expedientes físicos, notificaciones a la comunidad, entre otras actividades derivadas del procedimiento único. Cabe notar que el proceso de entrega y validación de la información es un proceso complejo dado el volumen de información y las particularidades de la misma.

Conforme a lo expuesto las reuniones adelantadas en desarrollo de la ejecución del Acuerdo No. 361 de 2016, han dado cuenta del avance en la implementación de las actividades orientadas a obtener este producto. No obstante, también en las reuniones se han documentado varias dificultades que han afectado la ejecución normal del convenio y que dan sustento a una solicitud de prórroga, las cuales se resumen a continuación:

Retraso en validación de información catastral por parte del IGAC: A la fecha, la información geográfica entregada por el socio USAID está en proceso de mejoramiento para validación por parte del IGAC, lo que ha obligado al socio USAID a reprocesar la información resultado del barrido predial para su posterior entrega al IGAC. Dicha entrega se ha llevado a cabo durante los meses de marzo y abril de 2019 (hasta la fecha no se ha completado). Con base a la información validada por el IGAC, la ANT puede proceder a emitir actos administrativos sobre los predios de su competencia.

Análisis técnico jurídico insuficiente: la información técnico jurídica entregada por el socio USAID requirió de un análisis más a profundidad, posterior, para determinar con precisión las actuaciones administrativas que la ANT adelantará para cada predio. Esta actividad ha implicado reprocesos en las áreas de oferta de la ANT, especialmente en la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas- SATZF. La SATZF, si bien ha reforzado su equipo para responder a las necesidades del piloto, ante esta eventualidad, se ha visto en la necesidad de reprogramar los tiempos planeados para el procesamiento de información, impactando los rendimientos esperados.

Pruebas documentales y testimoniales para formalización: durante el barrido predial masivo, el socio USAID no recolectó las pruebas necesarias para los procesos de formalización de predios privados, es decir que



**El campo
es de todos**

Minagricultura

 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

para estas estas solicitudes la ANT solo cuenta con el levantamiento predial y el Formulario de Sujetos de Ordenamiento -FISO-. Ante esta eventualidad, el equipo base municipal, apoyado por FAO, debe proceder a la recolección de pruebas documentales y testimoniales, requisitos para la expedición de actos de apertura.

Cuellos de botella en la valoración RESO: solo hasta mediados de marzo, el socio USAID entregó en completitud los FISOS recolectados, aproximadamente 2919 solicitudes, para valoración del RESO. Ante el alto volumen de información entregada, y frente al cronograma planteado para el piloto, la Subdirección de Sistemas de Información ha tenido que redoblar esfuerzos para hacer control de calidad de lo recibido, proceder a hacer valoración de RESOS y trasladar los expedientes correspondientes a las áreas de oferta.

Estas dificultades, en el marco de un ejercicio sin precedentes como este, han implicado el ajuste de tiempos para el inicio de la fase de implementación de procedimiento único de acuerdo a la normativa y los tiempos inicialmente estimados.

Por otra parte, una vez comenzada la implementación del procedimiento único, la cual comienza con la Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Ovejas, la ANT procede a expedir los primeros actos de apertura de expedientes de acuerdo a la secuencia de recepción de información, para posteriormente pasar a la etapa de exposición pública de resultados del barrido predial masivo a la comunidad de Ovejas. El intercambio con la comunidad permitirá validar y realizar los ajustes correspondientes de lo obtenido hasta el momento. En ella se toma lo contemplado por el Decreto 902 y resolución 740 de 2017 en el que se consagra una jornada de exposición pública para los predios competencia de la ANT en modelo de asignación, reconocimiento de derechos y formalización a privados, así como lo establecido en el modelo 2.1.1. de Catastro Multipropósito para presentar a la comunidad los resultados del barrido predial masivo. Dado el volumen de predios identificados en Ovejas, más de 2900, las jornadas se realizarán por corregimiento, extendiéndose entre 1 a 5 días aproximadamente, de acuerdo al volumen de predios identificados en el corregimiento, el cual, en algunos casos sobrepasa los 500 predios a socializar y atender uno a uno a la comunidad.

Para esta etapa, se identificó como necesario que FAO continúe brindando acompañamiento técnico a la gestión de la agencia en cuanto al piloto de barrido predial masivo en Ovejas, con el fin de culminar exitosamente este ejercicio, y responder con las obligaciones de la agencia frente a la comunidad.

De igual manera debe precisarse que el cronograma de metas planteado por la agencia frente al piloto de Ovejas contempla la realización de la última exposición pública de resultados el 24 de Julio de 2019, posterior a estas sucede una etapa *ex post* la cual va desde la impresión y firma de los actos administrativos de cierre, su numeración, traslado al municipio de Ovejas y notificación masiva a la comunidad. Posteriormente se debe expedir por parte de las Subdirecciones, las constancias de ejecutoria y la solicitud de exención de impuestos, la cual se presenta ante la gobernación para expedición de certificado de exención de impuestos (ver Ordenanza 026 de 2017), y finalmente pasar a registrar los títulos ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por lo cual es necesario continuar con el convenio con FAO hasta el 30 de septiembre de 2019, para cumplir con dichas actividades.



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

Así las cosas, desde el momento de la suscripción del convenio a la fecha, se han evidenciado múltiples circunstancias ajenas a las voluntades de la Agencia Nacional de Tierras y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación — FAO — que han generado aplazamientos en los cronogramas inicialmente contemplados para el cumplimiento de las actividades cobijadas por el mismo; de igual manera estos imprevistos han implicado aumento en los costos de las actividades inicialmente planteadas, circunstancias que amerita la ADICIÓN y PRÓRROGA del ACUERDO NO. 361 DE 2016.

Los costos asociados a la adición se relacionan a continuación:

Línea	No.	Tiempo	Total
			\$315.000.000
Operativo Campo			
EBM-Ovejas	9	4 meses	
Gastos operativos Ovejas		4 meses	
Jornada Notificaciones Masivas		54 jornadas	
Validación			\$993.728.865
Validación: técnica, catastral y jurídica	10	4 meses	
Extracción y sistematización lecciones exposiciones públicas		3 meses	
Apoyo Técnico jurídico a SATZF	16	4 meses	
Apoyo valoración FISOS/RESOS en la SSIT	5	4 meses	
Maduración Sistemas Barrido Predial		5 meses	
Apoyo a Exposiciones Públicas			\$75.000.000
Gastos FAO			\$163.000.000
SUBTOTAL			\$1.546.728.865
OVERHEAD		1 vez	\$108.271.021
Subtotal adición ANT			\$1.655.000.000
Contrapartida FAO			\$1.655.000.000
Valor Total Adición			\$3.310.000.000

Estos costos le permitirán a la ANT finalizar la fase de barrido predial masivo para todos los corregimientos de Ovejas, en su etapa de recepción y validación de información; iniciar y avanzar en la implementación de procedimiento único para las solicitudes pendientes, a través de valoración y expedición de actos de inclusión al Registro de Sujetos de Ordenamiento-RESO-, realización de análisis técnico-jurídicos, expedición de actos de apertura del trámite administrativo, realización de exposiciones públicas de resultados y proyección de



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

actos de cierre del trámite administrativo. Asimismo, se madurará el sistema de información para soportar el proceso de Barrido Predial.

Como se explicó antes, la adición y prórroga va a permitir que la ANT cuente con una metodología participativa, descentralizada y validada para el proceso de formalización de la propiedad para el barrido predial. Para lo mismo, a través de esta adición se podrá apoyar las labores en campo, culminar el proceso de validación técnica, jurídica y catastral de la información, realizar los análisis técnico jurídico necesarios para las actuaciones administrativas y apoyar la realización de exposiciones públicas de resultados a la comunidad.

La solicitud de adición y prórroga fue presentada ante el comité de contratación de la ANT el 29 de abril de 2019, el cual dio su aprobación:

III. COMITÉ COORDINADOR DEL CONVENIO

El anterior análisis se llevó a consideración de las partes involucradas en una primera sesión presencial del comité coordinador el 29 de marzo de 2019, para luego presentarse para aprobación en una sesión virtual el 12 de abril de 2019.

El comité coordinador del periodo en cuestión desarrolló la siguiente agenda:

- Conformación del comité coordinador: Por solicitud del supervisor del convenio, se incluye al subdirector(a) de Planeación Operativa o su delegado como miembro permanente del comité coordinador del convenio. El delegado del subdirector(a) de Planeación Operativa será Justa Velosa.
- Seguimiento financiero al convenio: Con el fin de tener un panorama más actualizado previo a este comité se concretan dos reuniones con la Agencia para la revisión de los avances de la ejecución, los saldos a liberar y los nuevos requerimientos, se presenta la ejecución financiera con corte al 26 de marzo 2019 de acuerdo con el formato de la FAO en COP y USD.
- Justificación para una posible adición presupuestal-continuidad producto 1: ver punto II, del presente informe. Adicionalmente, se presenta proyección de adición para cumplir con las siguientes actividades:

Finalización Fase barrido Predial Masivo

- Recolección de testimonios para formalización en Ovejas
- Visitas agronómicas
- Recepción y procesamiento de 2900+ casos y anexos documentales en SIT
- Soporte al equipo FISO/RESO para valoración de RESO y remisión de casos a misionales

Implementación de Procedimiento único 2900 + casos

- Validación por parte de SATZF de información técnico jurídica para expedición de actos de apertura
- Notificaciones a comunidad de actos de apertura y actos de cierre para solicitudes de formalización y/o asignación de derechos
- Realización y atención durante 11 jornadas de exposición pública de resultados del barrido, una por corregimiento

Diseño e implementación de un sistema de información para soportar el proceso de los operadores de Barrido Predial Masivo



El campo
es de todos

Minagricultura

 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

Por lo tanto, todo el equipo humano y gastos operativos asociado a estas actividades se solicitan extenderse hasta el 31 de agosto 2019.

- Proyección adición y aprobación: El comité aclara que el saldo disponible en el informe revisado con corte al 26 de marzo 2019 en COP es de \$ 206.207.903 y en USD es de \$29.919. Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del proyecto según acuerdo firmado entre las partes es en USD, el proyecto ha sido afectado por la tasa cambiaria y por esta razón los recursos actuales disponibles del proyecto, no son suficientes para cubrir las actividades ya proyectadas que fueron revisadas en el comité del mes de febrero. El valor de las proyecciones puede variar en el momento de su ejecución por la aplicación de la tasa de cambios que se realiza en dos momentos diferentes, uno en el compromiso y otro en momento del pago. Esta nueva distribución de recursos está calculada en USD a tasa del mes de abril 2019, la cual es necesario oficializar mediante revisión presupuestal ante la Oficina de Finanzas de la FAO en Roma, para que se vea reflejada en el presupuesto oficial del Proyecto.

Una vez revisados los últimos requerimientos y acordado entre las partes se presentan la proyección por línea, para aprobación del comité sin tener en cuenta el saldo disponible del proyecto a 30 de marzo según informe financiero debido al riesgo de la fluctuación de la tasa de cambio que afecta el presupuesto en USD que es la moneda oficial del convenio.

RESÚMEN POR LINEAS NUEVOS REQUERIMIENTOS HASTA SEPTIEMBRE 30 2019			
PARENT	DESCRIPCIÓN	VALOR COP	VALOR USD
5013	CONSULTORES	\$ 413.146.827,55	129.797,94
5014	CONTRATOS	\$ 843.515.692,67	265.006,50
5021	VIAJES	\$ 73.920.000,00	23.223,37
5023	CAPACITACIÓN	\$ 64.686.000,00	20.322,34
5024	FUNGIBLES	\$ 4.618.000,00	1.450,83
5025	NO FUNGIBLES	\$ -	-
5027	SOPORTE TÉCNICO	\$ 44.701.398,63	14.043,79
5028	GASTOS OPERATIVOS	\$ 100.671.154,00	31.627,76
	SUBTOTAL ADICIÓN	\$ 1.545.259.072,85	485.472,53
5029	OVERHEAD	\$ 108.168.135,10	33.983,08
	TOTAL ADICIÓN	\$ 1.653.427.207,95	519.455,61
USD a tasa de Abril 2019.			

- Varios: Adicionalmente en este comité se revisaron y aprobaron: metas acumuladas del convenio; ajustes al POA, Contrapartidas-Aportes no monetarios y aprobaciones.

IV. Seguimiento técnico del convenio.

En el marco del análisis para una posible adición y prórroga del convenio, se solicitó a FAO presentar una tabla del agregado de productos y resultados ejecutados durante los 28 meses del convenio, a saber:

	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

Cuenta	Descripción/Unidad de medida	Cantidad	Meses de Operación
CONSULTANTS	# de personas contratadas, promedio mensual	28	28
CONTRACTS	# de contratos	9	28
	Carta de Acuerdo con ANZORC-ZRC	1	
	Contratación de Consultores bajo supervisión directa ANT	5	
	Desarrollo SIG Producto 3	1	
	Edición de Documentos ZRC	2	
	COP	\$ 1.163.966.877	28
	Carta de Acuerdo con ANZORC-ZRC	\$ 200 000 000	
	Contratación de Consultores bajo supervisión directa ANT	\$ 452 471 877	
	Desarrollo SIG Producto 3	\$ 486 000 000	
	Edición de Documentos ZRC	\$ 25 495 000	
LOCALLY	# de contratos	5	28
	Contratación consultores Ocasionales para Eventos de Intercambio Técnicos de Cooperación Sur-Sur	5	
	Contratos en COP	\$ 9.908.000	28
TRAVEL	# número de viajes realizados	284	28
TRAINING	Cantidad de eventos	30	28
	Capacitaciones Administrativas	2	
	Cursos de Seguridad	3	
	Mesa de Expertos ZRC	7	
	Intercambios Técnicos de Cooperación Sur-Sur	8	
	Jornadas Jurídicas, sociales, Comités de Campo, Semillero de Tierras, notificaciones	10	
	# de participantes	3.838	28
	Gastos detallado que incluye este rubro en COP	71.638.330	28
EXPENDABLE PROCUREMENT	Dotación de personal y de Oficina	\$ 14 112 430	
	Edición documentos Cooperación Sur-Sur	\$ 4 550 000	
	Impresión documentos Gestión del conocimiento	\$ 26 943 700	
	Impresión documentos ZRC	\$ 18 360 000	
	Insumos de aseo y cafetería	\$ 2 290 800	
	Papelaría	\$ 6 381 400	
NON EXPENDABLE PROCUREMENT	Descripción detallada de que incluye este rubro	-	-
TECHNICAL SUPPORT SERVICES	Descripción detallada de que incluye este rubro	\$ 30.100.000	28
	Evaluación técnica	\$ 30 100 000	
	Servicio de apoyo técnico	\$ -	
	Gastos de Reporte	\$ -	
GENERAL OPERATING EXPENSES	Descripción de los servicios incluidos en este rubro sobre el tiempo en COP	\$ 411.076.588	28
	Alquiler de Equipos de computo		
	Alquiler de Mobiliario		
	Arrendamiento Oficina Ovejas		
	Auxilio de comunicaciones e internet		
	Gastos Operativos Equipo Transversal		
	Miscelaneos, servicios públicos		
	Servicio de Aseo		
	Servicio de Mensajera		
	Servicio Transporte		

Adicionalmente, el seguimiento técnico para el bimestre marzo-abril corresponde a:

Equipo Municipal Ovejas:

- Realización de 61 jornadas de notificación de resoluciones de inclusión al RESO, 92 notificaciones de resolución de actos de apertura, recolección de 268 testimonios para solicitudes de formalización, y radicación ante oficina de Instrumentos públicos de Corozal de 92 actos de apertura.
- Se realizó espacialización y validación catastral de 90 predios rurales dispersos que fueron asignados al componente agronómico de equipo municipal por parte de la SATZF.



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

- Se realizó espacialización y validación catastral de 279 predios en Flor del Monte con el fin de verificar límites corregimentales. 14 predios fueron identificados dentro del límite corregimental del San Rafael.
- Se realizaron cruces geográficos de 17 predios en los cuales la alcaldía presta algún servicio público
- Se realizaron reuniones con la secretaria de planeación, oficina municipal de tierras y con el Alcalde
- En el marco de las visitas agronómicas de predios baldíos, se realizaron 59 inspecciones oculares, quedando pendientes 41 predios por visitar
- Se apoyo técnicamente la actualización del plan de ordenamiento social de la propiedad rural para el corregimiento de Flor del Monte.
- Desde lo social se acompañaron las jornadas de notificación masiva, garantizando la comunicación y coordinación a través de los Semilleros de la Tierra y el Territorio.
- Se atendieron 14 usuarios en la oficina de ovejas
- Se atendieron personas interesadas durante la realización de las primeras tres exposiciones públicas de resultados en el corregimiento de Flor del Monte los días 14, 21 y 29 de mayo de 2019

Equipo Catastral SPO

A continuación se relacionan las actividades realizadas para cada municipio en el marco de la construcción de POSPRs:

SOCIO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO	REVISIÓN DE PLAN	GENERACIÓN DE CIFRAS	GENERACIÓN DE SAJUDAS PARA PLAN
OIM	ATACO	X	X	
OIM	RIOBLANCHO	X		
OIM	CHAPARRAL	X	X	
OIM	PLANADAS	X	X	
OIM	PRADERA	X		
OIM	FLORIDA	X	X	
OIM	PUERTO LLERAS	X		
PNUD	ZAMBRANO	X		
PNUD	FONSECA			X
PNUD	ARACATACA			X

Tabla 3. Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural – POSPR

- En el marco del Piloto de Implementación en Ovejas, se depuró el Anexo 15 contratando la información con la información geográfica del corregimiento, se cruzó la información con la información disponible de FISO y RESO, se identificaron predios de mayor extensión que sufrieron mutaciones y se generaron mapas para la construcción del documento de actualización del POSPR.
- Se avanzó en la gestión de productos relacionados con la re-densificación de la Red geodésica del socio Valor + de los municipios de Cáceres, Ituango, Tarazá y Valdivia.
- Validación y control de calidad de cartografía social veredal del socio PNUD.
- Gestión para selección y aplicación de tipologías de análisis en matrices de análisis predial- MAPRE- del socio PNUD

Equipo Validador



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

- Revisión técnica a productos del Piloto de Ovejas entregados por el PTDR de USAID para los corregimientos de Flor del Monte, Chengue, San Rafael, Don Gabriel, Almagra, Canutal y Canutalito
- Cargue de pruebas testimoniales al SIT
- Conformación de matriz de seguimiento y control de documentos entregados por el socio PTDR
- Apoyo en la gestión documental del productos entregados por el PTDR de USAID

Equipo apoyo a la SATZF

El equipo de proyecto de las zonas focalizadas, ha venido trabajando todas las asignaciones de expedientes del barrido predial del Municipio de Ovejas, para este bimestre se trabajó en la asignación correspondiente al corregimiento de Flor del Monte, la asignación estaba comprendida de 434 expedientes, a continuación, se muestra la distribución de los mismos.

Tabla 1. Número de predios en el corregimiento Flor del Monte

Número de predios asignados a zonas focalizadas	Número predios restantes del Barrido	Número de predios Barrido Flor del Monte
434	381	815

Los aportes realizados por cada uno de los componentes del equipo fueron:

COMPONENTE JURÍDICO

FRENTES DE TRABAJO	ACTIVIDADES ADELANTADAS MARZO 2019	ACTIVIDADES ADELANTADAS ABRIL 2019	RESTRICCIONES
COMPONENTE JURIDICO			
Se analizaron 434 asignaciones del corregimiento de Flor del Monte, Municipio de Ovejas.	Se analizaron 100 de Asignaciones del corregimiento de Flor del Monte, Municipio de Ovejas.(Fisos).	Se llevó acabo la notificación de 92 resoluciones de apertura en el corregimiento de Flor del Monte, Municipio de Ovejas.	De 434 asignaciones del corregimiento de Flor del Monte, Municipio de Ovejas, se encontraron restricciones juridicas que afectan a 65 fisos.
Del análisis se encontraron algunas restricciones juridicas y se realizaron resoluciones de apertura e informes técnico juridicos.	De: 100 asignaciones del corregimiento de Flor del Monte, Municipio de Ovejas. (Fisos), se realizaron 98 resoluciones de apertura.	Se analizaron 334 asignaciones del corregimiento de Flor del Monte, Municipio de Ovejas (Fisos).	
	De 100 asignaciones del	De 334 asignaciones	



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

	corregimiento de Flor del Monte, Municipio de Ovejas (Fisos), se elaboraron 98 informes técnico jurídicos.	de corregimiento de Flor del Monte, Municipio de Ovejas (Fisos), se realizaron 271 resoluciones de apertura.	
	De 100 asignaciones del corregimiento de Flor del Monte, Municipio de Ovejas (Fisos), se encontraron restricciones jurídicas que afectan a 2 fisos.	De 334 asignaciones de corregimiento de Flor del Monte, Municipio de Ovejas (Fisos), se elaboraron 271 informes técnico jurídicos.	
		De 334 asignaciones de corregimiento de Flor del Monte, Municipio de Ovejas (Fisos), se encontraron restricciones jurídicas que afectan a 63 fisos.	

COMPONENTE AGRONÓMICO

FRENTES DE TRABAJO	ACTIVIDADES ADELANTADAS A MARZO 2019	ACTIVIDADES ADELANTADAS A ABRIL 2019	RESTRICCIONES
COMPONENTE AGRONÓMICO			
Análisis y validación de la información agronómica necesaria para la proyección de los actos administrativos pertinentes para la adjudicación de predios baldíos del municipio de Ovejas, Sucre.	Para la proyección de los actos administrativos pertinentes para la adjudicación de predios baldíos del municipio de Ovejas, corregimiento de Flor del Monte, de 184 procesos, se revisaron documentos necesarios desde el componente agronómico, como son: escogencia de régimen, ubicación (rural disperso o centro poblado), plano (área), inspección ocular,	Para la proyección de los actos administrativos pertinentes para la adjudicación de predios baldíos del municipio de Ovejas, corregimiento de Flor del Monte, de 228 procesos, se revisaron documentos necesarios desde el componente agronómico, como son: escogencia de régimen, ubicación (rural disperso o centro poblado), plano (área), inspección ocular,	De los 434 procesos del corregimiento de Flor de Monte, Ovejas; a 22 de ellos les hace falta algún tipo de soporte agronómico como escogencia de régimen, plano, inspección ocular, anexo 5 o ficha predial, para su revisión y validación.



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

	anexo 5 o ficha predial, FISO; así como la normatividad vigente: Ley 160 de 1994, Resolución 041 de 1996, Acuerdo 014 de 1995, Decreto-Ley 902 de 2017 y Resolución 740 de 2017, y con la información de estos documentos se diligenció una base datos con el fin de recopilar información agronómica relevante para el proceso de adjudicación.	anexo 5 o ficha predial, FISO; así como la normatividad vigente: Ley 160 de 1994, Resolución 041 de 1996, Acuerdo 014 de 1995, Decreto-Ley 902 de 2017 y Resolución 740 de 2017, y con la información de estos documentos se diligenció una base datos con el fin de recopilar información agronómica relevante para el proceso de adjudicación.	
Elaboración de conceptos agronómicos modelo para los Informes técnico-jurídicos preliminares (ITJP).	Se elaboró un documento con los lineamientos y conceptos agronómicos modelos para la construcción de los ITJP, relacionando lo que se debe diligenciar en cada parte agronómica de este, dependiendo de la ubicación de los predios -centro poblado o predios rurales dispersos- y, conceptos agronómicos dependiendo el régimen de escogencia.		
Determinación de la Unidad Agrícola Familiar – UAF ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.	Se determinaron 184 UAF, dependiendo del régimen de escogencia, esto es, si el solicitante escogió la Ley 160 de 1994, se determinó el rango de UAF por Zonas Relativamente Homogéneas correspondiente al municipio de Ovejas (36 a 49 ha) o, si el área del predio no se encontraba dentro de este rango, se determinó la excepción por la cual podría ser adjudicado el predio, de	Se determinaron 228 UAF, dependiendo del régimen de escogencia, esto es, si el solicitante escogió la Ley 160 de 1994, se determinó el rango de UAF por Zonas Relativamente Homogéneas correspondiente al municipio de Ovejas (36 a 49 ha) o, si el área del predio no se encontraba dentro de este rango, se determinó la excepción por la cual podría ser	De los 434 procesos del corregimiento de Flor de Monte, Ovejas; a 22 de ellos no se les pudo determinar la UAF, debido a que les hace falta algún tipo de soporte agronómico, como se mencionó anteriormente.



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

	conformidad con el Acuerdo 014 de 1995. Por otro lado, si el solicitante escogió el Decreto-Ley 902 de 2017 y el predio se ubica en zona Rural Dispersa, se realizó el cálculo de UAF predial, de conformidad con la Resolución 2533 de 2018 o si el predio se ubicaba en un centro poblado, se determinó que este sería adjudicado bajo el concepto de tierra insuficiente, lo cual corresponde a la excepción de la UAF predial.	adjudicado el predio, de conformidad con el Acuerdo 014 de 1995. Por otro lado, si el solicitante escogió el Decreto- Ley 902 de 2017 y el predio se ubica en zona Rural Dispersa, se realizó el cálculo de UAF predial, de conformidad con la Resolución 2533 de 2018 o si el predio se ubicaba en un centro poblado, se determinó que este sería adjudicado bajo el concepto de tierra insuficiente, lo cual corresponde a la excepción de la UAF predial.	
Elaboración de la parte agronómica de los Informes técnico-jurídicos preliminares (ITJP).	Se elaboraron 184 Informes Técnico Jurídicos Preliminares Agronómicos (ITJP), de predios baldíos PN del municipio de Ovejas, del corregimiento de Flor del Monte. Estos ITJP, se diligenciaron con conceptos agronómicos correspondientes al desarrollo de la Resolución 740 de 2017, artículo 72, literales c, d, e, f y g; así mismo, dependiendo del régimen de escogencia, se determina la UAF, ya sea por la Ley 160 de 1994 por Zonas Relativamente Homogéneas correspondiente al municipio o por sus excepciones de conformidad con el Acuerdo 014 de 1995; o por el Decreto-Ley 902 de 2017, en donde se realiza el cálculo de UAF predial, de	Se elaboraron 228 Informes Técnico Jurídicos Preliminares Agronómicos (ITJP), de predios baldíos PN del municipio de Ovejas, del corregimiento de Flor del Monte. Estos ITJP, se diligenciaron con conceptos agronómicos correspondientes al desarrollo de la Resolución 740 de 2017, artículo 72, literales c, d, e, f y g; así mismo, dependiendo del régimen de escogencia, se determina la UAF, ya sea por la Ley 160 de 1994 por Zonas Relativamente Homogéneas correspondiente al municipio o por sus excepciones de conformidad con el Acuerdo 014 de 1995; o por el Decreto-Ley 902 de	De los 434 procesos del corregimiento de Flor de Monte, Ovejas; a 22 de ellos no se les pudo elaborar el ITJP Agronómico, debido a que les hace falta algún tipo de soporte agronómico, como se mencionó anteriormente.



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

	conformidad con la Resolución 2533 de 2018 o por la excepción de la UAF predial. También se diligenció el capítulo de "USO", en donde se menciona de forma general y de acuerdo a la documentación suministrada por el Barrido Predial, en qué se está usando o explotado el predio actualmente y, bajo que UAF podría ser adjudicado.	2017, en donde se realiza el cálculo de UAF predial, de conformidad con la Resolución 2533 de 2018 o por la excepción de la UAF predial. También se diligenció el capítulo de "USO", en donde se menciona de forma general y de acuerdo a la documentación suministrada por el Barrido Predial, en qué se está usando o explotado el predio actualmente y, bajo que UAF podría ser adjudicado.	
Revisión general de los autos de apertura proyectados para la adjudicación de baldíos del Municipio de Ovejas.	Se revisaron 100 autos de apertura de 434 trámites administrativos de reconocimiento de derechos a través de procedimiento único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017; estos, de predios baldíos PN del municipio de Ovejas, corregimiento de Flor del Monte. Estos autos de apertura, corresponden a las versiones finales, en donde se encuentra consolidada la información de los 3 componentes: jurídico, catastral y agronómico. Estas revisiones se realizan con el fin de detectar errores de fondo y forma en estos documentos.	Se revisaron 230 autos de apertura de 434 trámites administrativos de reconocimiento de derechos a través de procedimiento único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017; estos, de predios baldíos PN del municipio de Ovejas, corregimiento de Flor del Monte. Estos autos de apertura, corresponden a las versiones finales, en donde se encuentra consolidada la información de los 3 componentes: jurídico, catastral y agronómico. Estas revisiones se	De los 434 procesos del corregimiento de Flor de Monte, Ovejas; a 104 de ellos, no se les elaboró auto de apertura, debido a que presentan restricciones jurídicas o catastrales o agronómicas.



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

		realizan con el fin de detectar errores de fondo y forma en estos documentos.	
Solicitud de certificados de uso del suelo a las oficinas de planeación en cada uno de los municipios.	Se realizó la solicitud de los certificados de uso del suelo, de 19 predios ubicados en la zona rural dispersa, correspondientes al municipio de Ovejas, corregimiento de Flor del Monte. Esta solicitud se hace con el fin de identificar si el suelo está siendo explotado de acuerdo a su vocación, establecida por su capacidad de uso, con el fin de garantizar que, en la determinación de la UAF, se adopten sistemas productivos apropiados para una mejor utilización de los recursos naturales. Para los predios que se ubican en Centros Poblados, no se requiere esta certificación.		Los tiempos de respuesta de la oficina de planeación municipal, son muy lentos, por lo cual se retrasa la proyección de los actos administrativos que requieren estos certificados.

COMPONENTE CATASTRAL

FRENTE DE TRABAJO	ACTIVIDADES ADELANTADAS A MARZO 2019	ACTIVIDADES ADELANTADAS A ABRIL 2019	RESTRICCIONES
COMPONENTE CATASTRAL			



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

Análisis y validación de la información espacial (Datos geográficos, anexos y planos) suministrada necesaria para la proyección de los actos administrativos pertinentes para la adjudicación de predios baldíos del municipio de Ovejas, Sucre.	Para la proyección de los actos administrativos pertinentes para la adjudicación de predios baldíos del municipio de Ovejas, corregimiento de Flor del Monte, de 100 procesos, iniciales de los cuales se realizó la revisión de los planos e información validada por el IGAC de los anexos 15 y 17, los planos y hoja de coordenadas, esto con el fin de poder realizar las actividades catastrales como la revisión de áreas a adjudicar, adjudicatarios, restricciones del predio por cruces geográficos y redacción técnica de Linderos, con esta información se diligenciaron las bases de datos que son insumo para generación de la documentación del proceso.	Para la proyección de los actos administrativos pertinentes para la adjudicación de predios baldíos del municipio de Ovejas, corregimiento de Flor del Monte, de 334 procesos, iniciales de los cuales se realizó la revisión de los planos e información validada por el IGAC de los anexos 15 y 17, los planos y hoja de coordenadas, esto con el fin de poder realizar las actividades catastrales como la revisión de áreas a adjudicar, adjudicatarios, restricciones del predio por cruces geográficos y redacción técnica de Linderos, con esta información se diligenciaron las bases de datos que son insumo para generación de la documentación del proceso.	De los 434 procesos del corregimiento de Flor de Monte, Ovejas; no existen restricciones espaciales o por cruce Geográfico, sin embargo no se pudieron adelantar 19 redacciones técnicas de linderos por inconsistencias de planos.
Elaboración de conceptos Catastrales modelo para los Informes técnico-jurídicos preliminares (ITJP):	Se elaboró un documento con los lineamientos y conceptos Catastrales, junto con la revisión de información de la Superintendencia de Notariado y registro para confirmar que los predios fueran Baldíos, y demás restricciones por norma del componente catastral para realizar la construcción de los ITJP, relacionando lo que se debe diligenciar en cada uno la parte Catastral de este, dependiendo de la ubicación de los predios -centro poblado o predios rurales dispersos- y,	Se elaboró un documento con los lineamientos y conceptos Catastrales, junto con la revisión de información de la Superintendencia de Notariado y registro para confirmar que los predios fueran Baldíos, y demás restricciones por norma del componente catastral para realizar la construcción de los ITJP, relacionando lo que se debe diligenciar en cada uno la parte Catastral de este, dependiendo de la ubicación de los predios -centro poblado o predios rurales dispersos- y,	



**El campo
es de todos**

Minagrcultura

 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

	conceptos luego del estudio y la verificación para 100 expedientes.	conceptos luego del estudio y la verificación para 188 expedientes.	
Revisión general de los autos de apertura proyectados para la adjudicación de baldíos del Municipio de Ovejas.	Se revisaron 100 autos de apertura de 434 trámites administrativos de reconocimiento de derechos a través de procedimiento único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017; estos, de predios baldíos PN del municipio de Ovejas, corregimiento de Flor del Monte. Estos autos de apertura, corresponden a las versiones finales, en donde se encuentra consolidada la información de los 3 componentes: jurídico, catastral y agronómico.	Se revisaron 230 autos de apertura de 434 trámites administrativos de reconocimiento de derechos a través de procedimiento único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017; estos, de predios baldíos PN del municipio de Ovejas, corregimiento de Flor del Monte. Estos autos de apertura, corresponden a las versiones finales, en donde se encuentra consolidada la información de los 3 componentes: jurídico, catastral y agronómico.	De los 434 procesos del corregimiento de Flor de Monte, Ovejas; a 104 de ellos, no se les elaboró auto de apertura, debido a que presentan restricciones jurídicas o catastrales o agronómicas.
<u>Atención durante Jornadas de exposición Pública de Resultados:</u> El equipo de apoyo SATZ atendió jurídica y catastralmente las siguientes solicitudes de signación de baldíos en el marco de las tres primeras exposiciones públicas de resultados, realizadas en el corregimiento de Flor del Monte, Ovejas: • Mayo 14: 92 solicitudes atendidas • Mayo 21: 119 solicitudes atendidas • Mayo 29: 105 solicitudes atendidas V. Mesas técnicas Con el fin de adelantar actividades de supervisión y evaluar nuevas necesidades se adelantaron mesas técnicas en las siguientes fechas: • Abril 9 de 2019: preparación comité coordinador • Mayo 2 de 2019: mesas sobre estrategia de participación y gestión de conocimiento segundo semestre de 2019 • Mayo 3 de 2019: mesas sobre proyección Observatorio de Tierras Rurales para segundo semestre de 2019			



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

- Mayo 6 de 2019: mesa técnica identificación de necesidades y apoyo técnico en control de calidad de actividades y productos durante el BPM
- Mayo 31 de 2019: revisión ejecución financiera con corte mayo 31 de 2019



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

- Validación por parte de SATZF de información técnico jurídica para expedición de actos de apertura
- Notificaciones a comunidad de actos de apertura y actos de cierre para solicitudes de formalización y/o asignación de derechos
- Realización y atención durante 11 jornadas de exposición pública de resultados del barrido, una por corregimiento

Diseño e implementación de un sistema de información para soportar el proceso de los operadores de Barrido Predial Masivo

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Como parte del seguimiento administrativo del convenio se realizaron diversas acciones: comités directivos, comités técnicos operativos, informes de avances e informes de supervisión. A continuación, se listan los avances que se han realizado a la fecha:

- Comité Técnico Coordinador: se han realizado 21 comités técnicos coordinadores
- Informes de avance técnico y financiero - 13 informes bimensuales presentados por FAO
- Informes de supervisión: 12 informes de supervisión

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

1. Datos Generales:

ENTIDAD	VALOR
RECUROS ANT	\$ 8.019.017.395
RECURSOS FAO	\$ 8.114.844.619
VALOR TOTAL CONVENIO	\$16.133.862.013

2. Desembolsos: Con corte a febrero 30 de 2019, se han realizado desembolsos por valor de \$8.019.017.395 pesos.

DESEMBOLSOS	
ITEM	VALOR
Primer Desembolso	1.639.240.000
Segundo Desembolso	2.458.860.000
Tercer Desembolso	1.606.072.776
Cuarto Desembolso	659.844.619
Quinto desembolso	1.655.000.000
TOTAL DESEMBOLSADO	8.019.017.395,00


 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

3. Desembolsos Pendientes:

No se encuentran desembolsos pendientes

4. Ejecución del Cooperante (Recursos ANT).

DESCRIPCIÓN	CORTE A 30 DE ABRIL DEL 2019
OBLIGADO	\$ 5.734.593.539,87
COMPROMISOS	\$ 500.723.799,70
PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	\$ -
TOTAL/RECURSOS DESEMBOLSADOS	\$ 8.019.017.395
NUEVOS COMPROMISOS	\$ -
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 2.284.423.855

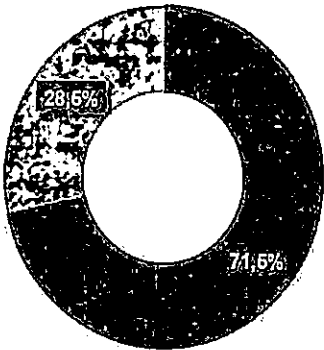

30-abr
SALDO DISPONIBLE DEL VALOR DESEMBOLSADO
\$ 2.284.423.855
TOTAL GASTO
\$ 5.734.593.540
COMPROMETIDO
\$ 500.723.800
TOTAL GASTO + COMPROMETIDO
\$ 6.235.317.340
VALOR TOTAL ACTUAL RECURSOS ANT
\$ 8.019.017.395



El campo es de todos

Minagricultura

 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

5. Nivel de Ejecución

Nivel de ejecución financiera	
Descripción.	abr-19
% Ejecución frente a los recursos desembolsados.	71,5%
% Pendiente de Ejecución (De los recursos desembolsados).	28,5%

6. Ejecución contrapartida (FAO)

DESCRIPCIÓN	CORTE A 30 DE ABRIL DEL 2019
EJECUTADO	\$ 6.043.405.573
PENDIENTE POR EJECUTAR	\$9.088.657.045
TOTAL RECURSOS	\$ 15.132.062.619

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS FAO	
DESCRIPCIÓN	CORTE A 31 DE AGOSTO DEL 2019
EJECUTADO %	39,94%
PENDIENTE POR EJECUTAR %	60,06%

Nota: Los valores de la contrapartida son presentados en USD, debido a que el cooperante los reporta en dicha divisa.

CONCEPTO	VALOR
% de dedicación; acompañamiento, técnico, soporte técnico. Aurelie Bress Apoyo del Oficial Técnico Javier Molina Sistema de Administración de Tierras 70% de la misión de apoyo del Oficial Técnico Javier Molina, durante el mes de	362.351,00 USD

	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

noviembre incluye (tiketes, viáticos). Soporte técnico permanente de la Oficial Nacional de Proyectos	
Carta de Acuerdo con Fensuagro "Aumentar el uso de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques entre las OSC y las organizaciones de base".	30.000,00 USD
Dedicación de la oficial de comunicaciones FAO y el equipo del área de comunicaciones, para estructuración de componente de Gestión del Conocimiento del producto 1. "Manual de comunicación, para Diagnósticos Participativos de Comunicación Rural"	55.000,00 USD
Equipo operativo y logístico de las diferentes áreas de la Representación FAO, Colombia que darán soporte durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. Apoyo del área jurídica Apoyo del área de Administración Área de Operaciones y finanzas Apoyo de Programas	401.000,00 USD
Evento FAO- Presidencia- ANT- INC Uruguay	295,00 USD
Evento intercambio de experiencias entre la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras. Para socializar el proceso de conformación de la Unidad (recomendaciones, experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas)	1.577,00 USD
Expertos de la oficina Chile, Panamá y Roma. Tiketes y viáticos (Aurelie Bress; Francesca Felicane y Fabrice Eduard viaje a Colombia. 5 al 8 de Diciembre) El señor Richard Torsiano - Alojamiento.	7.800,00 USD
Formulación y construcción de metodologías, herramientas, materiales pedagógicos. Curso de directrices voluntarias género. Participación de cuatro personas de ANT en el Curso virtual y presencial en el Programa de aprendizaje Directrices Voluntarias de Gobernanza de La Tierra para hombres y mujeres. (Junio - Julio 2018). Soporte permanente del área de comunicaciones y apoyo específico en el lanzamiento del libro de ZRC con dedicación de 3 personas para el evento Asesoría en el diseño, diagramación, corrección de estilo; metodología del evento; logística de todo el evento; proceso ISBN, etc.	27.000,00 USD



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

Honorarios de la consultora Componente 2. Evaluación de resultados de las Zonas de Reserva Campesina Constituidas. 1 de noviembre hasta junio 30 de 2017 y del 01 de Julio hasta Agosto 30 2018 Apoyo en el análisis del enfoque de Sistemas Socio-Ecológicos para entender los territorios; su ordenamiento y manejo; las interacciones socioecológicas complejas, que involucren una diversidad de territorialidades a partir de tres variables: i) articulación-capacidad institucional y de aplicación de la normatividad ii) desarrollos productivos sostenibles y iii) experiencias significativas como las interacciones entre ambos componentes. Métodos: Análisis de redes, Análisis de sostenibilidad agroecológica de sistemas productivos, análisis de información geográfica, análisis histórico-documental, análisis Experiencias significativas. Aporte y uso de instrumentos: 1. Información de autodiagnóstico de experiencias: Encuestas ICO, ICI y Productivas. 2. Información general de los territorios: Entrevista semiestructurada, mapa de actores y cartografía social 3. Información sobre implementación de la figura: Entrevistas semiestructuradas, Mesas técnicas y revisión fuentes documentales.	385.000,00 USD
Honorarios de la coordinadora del proyecto durante el mes de diciembre de 2016.	2.849,00 USD
Honorarios de un consultor - Abogado junior	3.270,00 USD
Honorarios de un consultor -Ingeniero Catastral. Noviembre-diciembre de 2016; enero - julio de 2017	12.080,00 USD
Insumos y recomendaciones de los talleres de concertación y apropiación de las DVGT, en el marco de la Carta de acuerdo: "Desarrollo del uso de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques entre las organizaciones de la Sociedad Civil y las organizaciones de base campesinas, indígenas y afrocolombianas".	15.000,00 USD
Material pedagógico y soporte técnico. *GUÍA RÁPIDA DE LA FAO para la Cooperación Sur-Sur Fomentar la colaboración entre los países del Sur del mundo. Apoyo de Dina López, Oficina Subregional de Panamá. Traducción del documento de presentación de la misión a Tailandia; preparación y coordinación de agenda con participantes. Francisco Carranza, revisión del documento de Cooperación Sur - sur y de cooperación triangular.	70.000,00 USD

 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

Metodologías de las Directrices Voluntarias de Gobernanza de la Tierra. Sistema de Administración de Tierras	450.000,00 USD
Misión de intercambio técnico a México, entre el 5 al 9 de diciembre de 2016: misión de 4 funcionarios de la (Director de la ANT, Miguel Samper Strauss, los Directores de Ordenamiento Social de la Propiedad, Juliana Cortés y de Acceso a Tierras, Javier Flórez; acompañados por la Jefe de Cooperación Internacional, Dianne Tawse Smith) Incluye, tickets, viáticos y terminales.	13.497,00 USD
Revisiones técnicas y soporte técnico del Oficial Técnico Fabrice Eduard	40.000,00 USD
Sergio Gómez Revisión del documento de Zonas de Reserva Campesina. Revisiones técnicas y soporte técnico de las Oficiales Aurelie Bress; Francesca Felicane y Manuela Cuvi.	48.000,00 USD
Suministro de Alojamiento, Salon y alimentación para evento Intercambio técnico Cooperación Sur-sur con Uruguay ANT-FAO del 05- al 09 de Febrero 2018.	826,00 USD
Transversal y en los % de los montos por productos. Persona dedicada el 50% del tiempo y costos parciales de soporte del área de monitoreo. Generación de plantillas /informes mensuales y semestrales de informes, de acuerdo con las actividades programadas por el proyecto. Esto con el fin de valorar los avances y hacer los reportes necesarios sobre las metas de cumplimiento: - PSIMER, Plataforma de monitoreo para evaluación de resultados. - Avance POA, para medir porcentualmente el avance de cumplimiento de tareas. - GANTT, genera alertas tempranas sobre actividades que puedan generar algún tipo de retraso. - Dashboard, informe ejecutivo sobre el desarrollo de actividades del proyecto como las dificultades presentadas.	90.800,00 USD
Viaje Francisco Carranza acompañamiento a misión de Intercambio Cooperación Sur-sur en Tailandia de la ANT Roma-Tailandia- Roma	4.418,00 USD
Viaje 2 funcionarios de INC de Uruguay misión de Intercambio cooperación Sur-sur ANT-FAO- INC en Bogotá Uruguay-Bogotá- Uruguay	1.355,00 USD
Total general	2.022.118,00 USD




 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

SEGUIMIENTO JURÍDICO
El convenio suscrito entre las partes se encuentra regido jurídicamente bajo los siguientes términos, que le otorgan soporte jurídico para la legitimad de las actuaciones de cada parte, en consecuencia, las partes cuenta con los siguientes documentos: 1. Ficha técnica del proyecto 2. Presupuesto del proyecto 3. Carta de intención de firma de convenio de cooperación OIM (5 octubre de 2016). 4. Los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por el ordenador del gasto, en donde se señala la disponibilidad de recursos para suscribir el presente convenio (No 10216) 5. Registro Presupuestal no.1079161047317 (1 de noviembre de 2016) 6. Estudios y documentos previos (14 de octubre 2016) 7. Acuerdo 361 de 1016 (2 de diciembre de 2016) 8. Plan Operativo No.1 (diciembre de 2016) 9. Plan Operativo No. 2 (diciembre de 2018) 10. Plan operativo No. 3 (abril 2019) 11. Enmienda No. 1 (diciembre de 2017) 12. Enmienda No 2 (Julio de 2018) 13. Enmienda No 3 (noviembre de 2018) 14. Enmienda No. 4 (mayo 30 de 2019)
OBSERVACIONES
Durante el mes de mayo la ejecución financiera del proyecto llegó a su techo presupuestal mientras se gestionaba la firma de la enmienda No. 4 para adición y prooroga del convenio y se surte el posterior proceso de desembolso de recursos. Este hecho ha impactado negativamente el ritmo de ejecución dado que las contrataciones previstas en la adición no han podido realizarse retrasando las actividades de apoyo al piloto de ovejas, refuerzos de equipos e inicio de nueva actividades. Por otra parte, cabe notar que en reunión realizada el 31 de mayo de 2019 entre la ANT y FAO se estuvo revisando el formato y profunda de los reportes técnicos - financieros y de contrapartida de FAO a la luz de la más reciente auditoría por parte de la Contraloría General de la Nación. Se acordó que FAO adelantaría una revisión a profundidad del tema y presentaría ante la ANT una propuesta de ajuste a los informes técnico-financieros. Asimismo FAo informó que proximately se realizará una misión de casa matriz con quien se revisará la modalidad de reporte de las contrapartidas, esto con el fin de mejorar la presentación de informes sujetos de evaluación por parte de los organismos de control del país.
RECOMENDACIONES
Es necesario hacer seguimiento frente a los compromisos de mejorar los informes técnico- financieros presentados por FAO. Evaluar propuesta que envíe el socio cooperante. Por otra parte, el atraso del desembolso tendrá un impacto frente a la ejecución esperada y las metas en el marco del piloto de CM y formalización en Ovejas, por lo tanto sería pertinente evaluar si el apoyo proyectado en la enmienda 4 del convenio será suficiente o si se debe pensar en nuevos esfuerzos.



 Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD		VERSIÓN	
	PROCESO		FECHA	

ANEXOS
• Informe técnico financiero con corte 29 de abril de 2019 • Acta No. 21 Comité coordinador • Enmienda No. 4 de 30 de mayo de 2019 • Estudios previos Adición y prórroga convenio 361 de diciembre de 2016 • Plan operativo abril 2019



Director de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural

Elaboró

Laura Ochoa/Gustavo Forero
 

Revisó

Catalina USeche
 
